



GRUNDSCHULE PETER-HÄRTLING, LAYENHOFSTRAÙE, MZ-FINTHEN

Zusammenlegung zweier Schulstandorte IM-1401

KOSTEN
38 MIO.€

FERTIGSTELLUNG GEPLANT
2027

LEISTUNGSPHASE

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

PROJEKTLEITUNG


Gebäudewirtschaft Mainz

MERKMALE & STANDARDS

- 5-Zügige Grundschule inkl. Ganztagesbereich + Verwaltung und Mensa
- Zweifeld-Sporthalle
- Passivhausstandard, Erdwärme, Holz-Hybridbauweise

STAND DER PROJEKTABWICKLUNG

- LP 7 Ausschreibungen sowie Auftragsvergaben der Ausbaugewerke
- Baumfällungen u. -verpflanzungen erfolgreich erfolgt
- Schadstoffsanierung u. Abriss beendet 10/2024
- LP 8 Rohbau Klassen- u. Verwaltungstrakt, sowie Mensa u. GTS-Bereich. Vorbereitende Arbeiten für Sporthalle

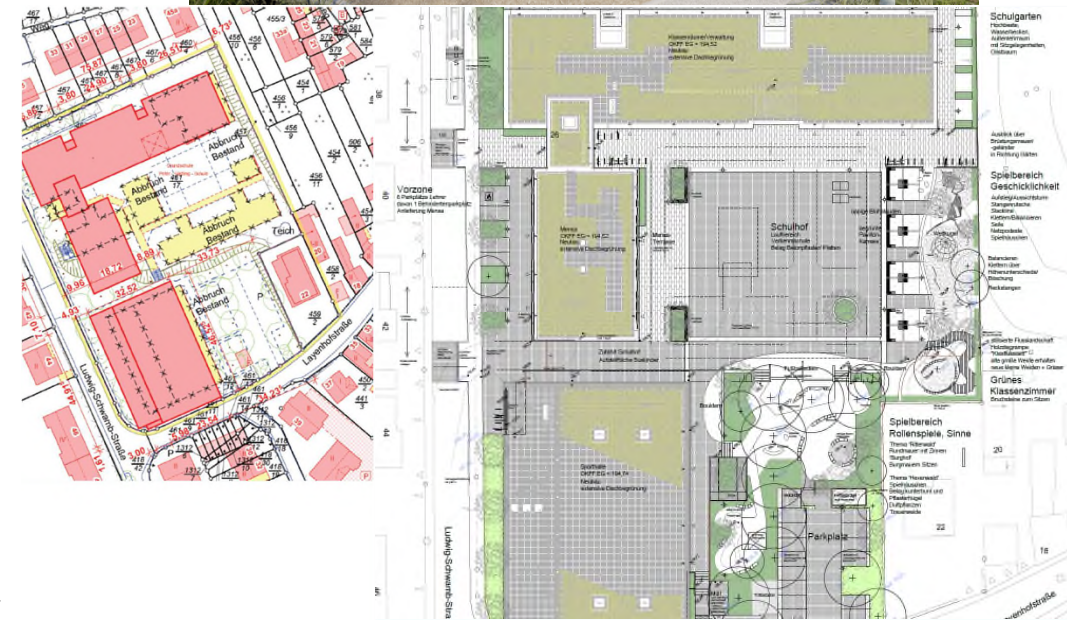

Schulgarten
Hochstamm
Auenbaum
Mittelstamm
Mittelstamm
Obstbaum

Anzahl der
Stuhlgänge
Sporthalle
Sporthalle
Sporthalle

Spielbereich
Geschicklichkeit
Anzahl der
Stuhlgänge
Sporthalle
Sporthalle
Sporthalle

Spielbereich
Rollenspiele, Sinne
Anzahl der
Stuhlgänge
Sporthalle
Sporthalle
Sporthalle

Parkplatz

Layenhofstraße
